

INWESTYCJA KOLEJOWA

Wejherowo, 29.06.2023 r.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu pn. „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiato – Kopalino”

WYKONAWCA:

Multiconsult
POLSKA


TGD ✦

ZAMAWIAJĄCY:




PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Zarządca narodowej sieci linii kolejowych

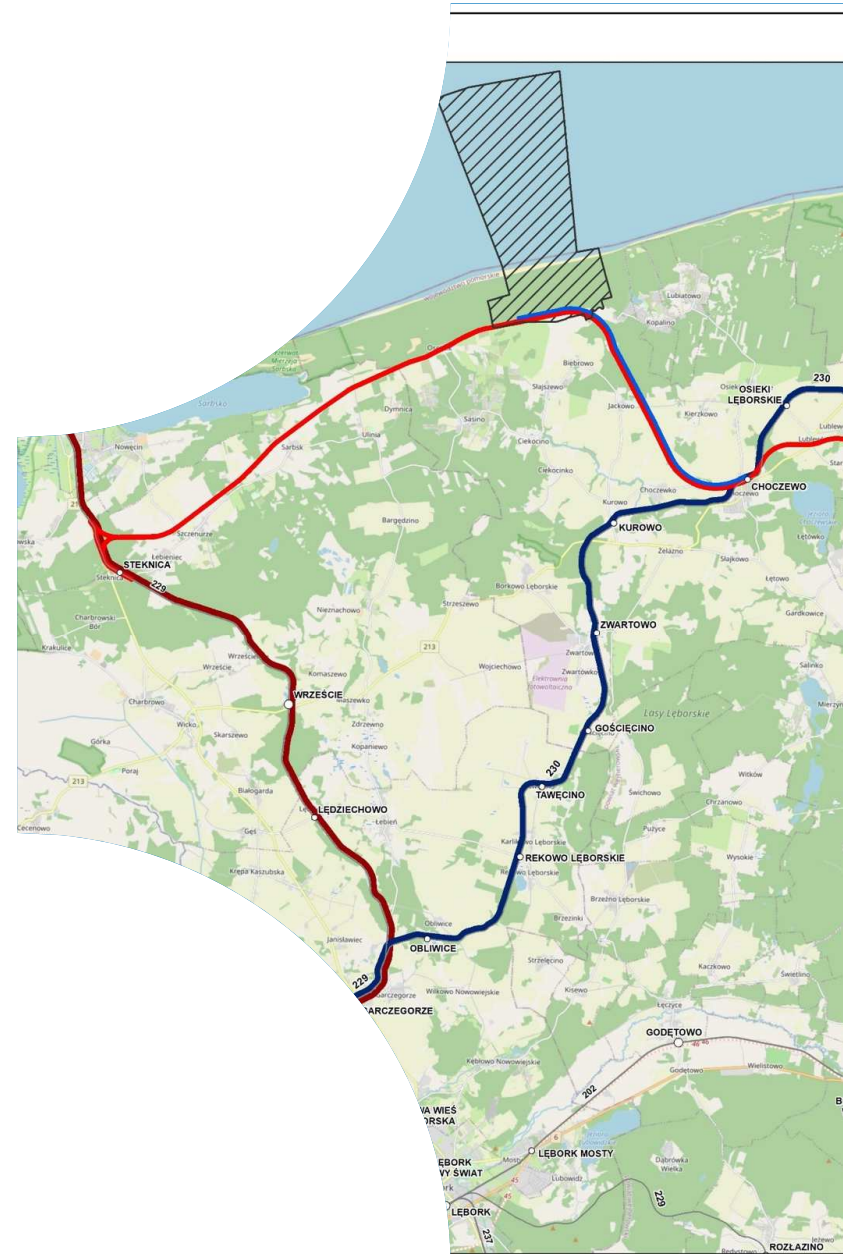


ZAKRES PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

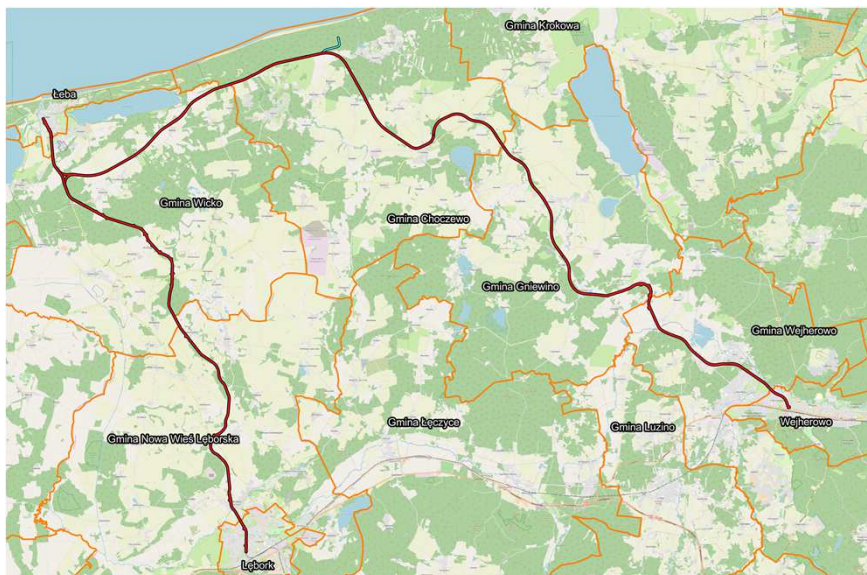

Wariant podstawowy

- modernizacja LK229 na odcinku Lębork – Łeba na potrzeby budowy i obsługi elektrowni jądrowej,
- modernizacja LK230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków,
- budowa jednotorowej linii kolejowej w nowym śladzie w relacji Choczewo – Elektrownia – Steknica wraz ze stacjami: Choczewo i Elektrownia oraz budowa niezbędnych łącznic kolejowych.

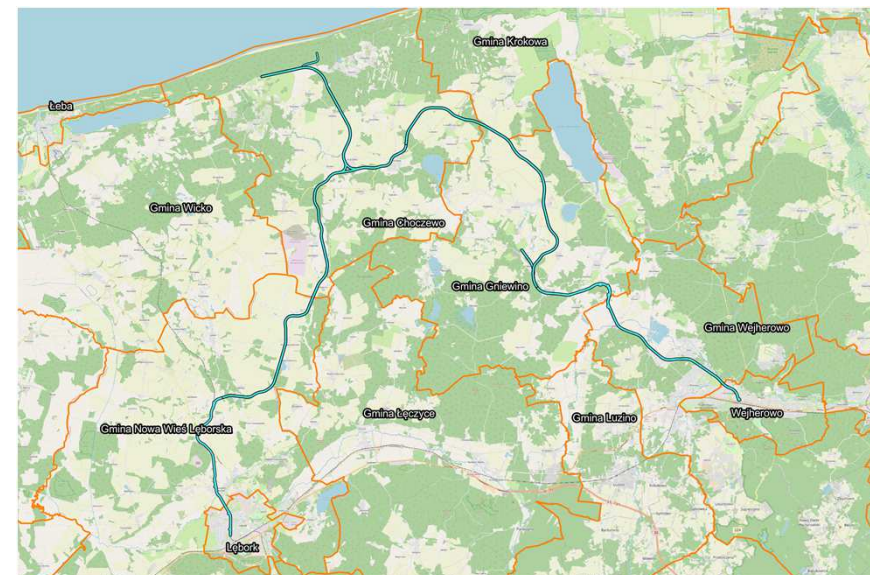

Wariant opcjonalny

- modernizacja linii kolejowej LK230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze,
- modernizacja linii kolejowej LK229 na odcinku Lębork – Garczegorze,
- budowa jednotorowej linii kolejowej w nowym śladzie, odgałęziającej się od Choczewa do Elektrowni wraz ze stacjami: Choczewo i Elektrownia oraz budowa niezbędnej łącznicy kolejowej w kierunku Garczegorze.

Multiconsult
POLSKA

TGD



HARMONOGRAM INWESTYCJI

Daty przekazania kluczowych etapów umowy do Zamawiającego:

Etap	Kwartał	Rok
Koncepcja programowo – przestrzenna	II	2023
Opracowanie projektu budowlanego	III	2024
Opracowanie projektu wykonawczego	I	2025
Opracowanie kompletu wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę	II	2025

Multiconsult
POLSKA

TGD



AKTUALNE ZAAWANSOWANIE PRAC PROJEKTOWYCH

◆ ETAP 1 – Koncepcja programowo-przestrzenna dla W1 i W2

- ✓ Przekazanie do Zamawiającego 2. wersji KPP - 23.06.2023;

◆ ETAP 3, Stadium 3.1 – Program badań geotechnicznych i projekt robót geologicznych

- ✓ Analiza i odniesienie się projektantów do uwag Zamawiającego do 1. wersji PBG i PRG;

◆ ETAP 3, Stadium 3.2 – Opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia do ROŚ

- ✓ Przekazanie opisu zakresu rzeczowego do ROŚ opracowanego na bazie 1. wersji KPP – 09.06.2023;
- ✓ Otrzymanie uwag Zamawiającego do 1. wersji opisu zakresu rzeczowego do ROŚ – 26.06.2023;

◆ ETAP 3, Stadium 3.4 – Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych

- ✓ Pomiary w terenie;
- ✓ Ciąg dalszy aktualizacji mapy zasadniczej (wykazanie zmian terenowych);



PLAN PRAC PROJEKTOWYCH – LIPIEC 2023

◆ ETAP 1 – Koncepcja programowo-przestrzenna dla W1 i W2

- Otrzymanie uwag Zamawiającego do 2. wersji KPP – 07.07.2023;
- Przygotowanie 3. wersji KPP;

◆ ETAP 3, Stadium 3.1 – Program badań geotechnicznych i projekt robót geologicznych

- Przygotowanie 2. wersji PBG i PRG w przypadku otrzymania pisemnego polecenia Zamawiającego;

◆ ETAP 3, Stadium 3.2 – Opis zakresu rzeczowego przedsięwzięcia do ROŚ

- Przygotowanie 2. wersji opisu zakresu rzeczowego do ROŚ;

◆ ETAP 3, Stadium 3.4 – Geodezyjna dokumentacja do celów projektowych

- Opracowanie pomiarów terenowych (kartowanie mapy, sporządzanie szkiców i wykazów współrzędnych pomierzonych punktów);
- przygotowanie mapy do celów projektowych (bez klauzuli).



ZAKŁADANY ZAKRES PRAC DROGOWYCH – ZESPÓŁ ZADANIOWY NR 1

Wariant preferowany

LK 229 odcinek Lębork - Łeba

Multiconsult
POLSKA

TGD



ZAKŁADANY ZAKRES PRAC DROGOWYCH – ZESPÓŁ ZADANIOWY NR 2

Wariant preferowany

LK 230 odcinek Wejherowo – Tadzino

Nowa LK230 odcinek Tadzino - Choczewo

Multiconsult
POLSKA

TGD



ZAKŁADANY ZAKRES PRAC DROGOWYCH – ZESPÓŁ ZADANIOWY NR 3

Wariant preferowany

Nowa LK odcinek Choczewo – Elektrownia

Nowa LK odcinek Elektrownia - Steknica

Multiconsult
POLSKA

TGD



Dziękuję za uwagę

Multiconsult
POLSKA

TGD

